

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO (PDT)


Fecha de inicio:	08-05-26
CLIENTE:	Promigas / Promioriente
Responsable:	Gerencia de Proyectos / Ing. Cristian Pedraza
E-mail:	cristian.pedraza@promigas.com

Código:	1749-PC-X-150
Orden de Compra:	4900117705
Rev.	0
Pág.	1 de 1

Ejecutor: SEDIMA CORP	Proyecto: INGENIERÍA DETALLADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTÓNOMO PARA LA LÍNEA TEMPORAL SAMORÉ: CRUCE “LA CHINA”
Líder: • Gerencia de Proyectos	Plan de trabajo: A: Emisión OC y Firma Acta de inicio. B: Planeación de la ejecución del proyecto. C: Análisis y revisión de alineamiento a los insumos y documentación técnica suministrada por el cliente (AGT) D: Desarrollo de la solución de ingeniería por bloques disciplinares para cada uno de los sitios conciderados en el proyecto. E: Presentación al cliente de avances y resultados de enfoque y abordaje de la solución. F: Ajustes finos de la solución para entrega final al cliente. G: Entrega de solución documentada al cliente. H: Apoyo complementario en sostenimiento postventa.
Interesados: • Promioriente • VPO • Autoridades externas	

PLAN de TRABAJO	
Fecha de inicio:	08-05-26
Fecha de Finalización:	09-18-26
Tipo de Acción / Prioridad:	ESTRATEGICO - NECESARIO

	Punto de Control	% Avance realizado
0	08-05-26	0%
1	08-09-26	15%
2	08-13-26	35%
3	08-18-26	50%
4	08-22-26	75%
5	08-27-26	82%
6	08-31-26	86%
7	09-04-26	90%
8	09-09-26	95%
9	09-13-26	98%
10	09-18-26	100%

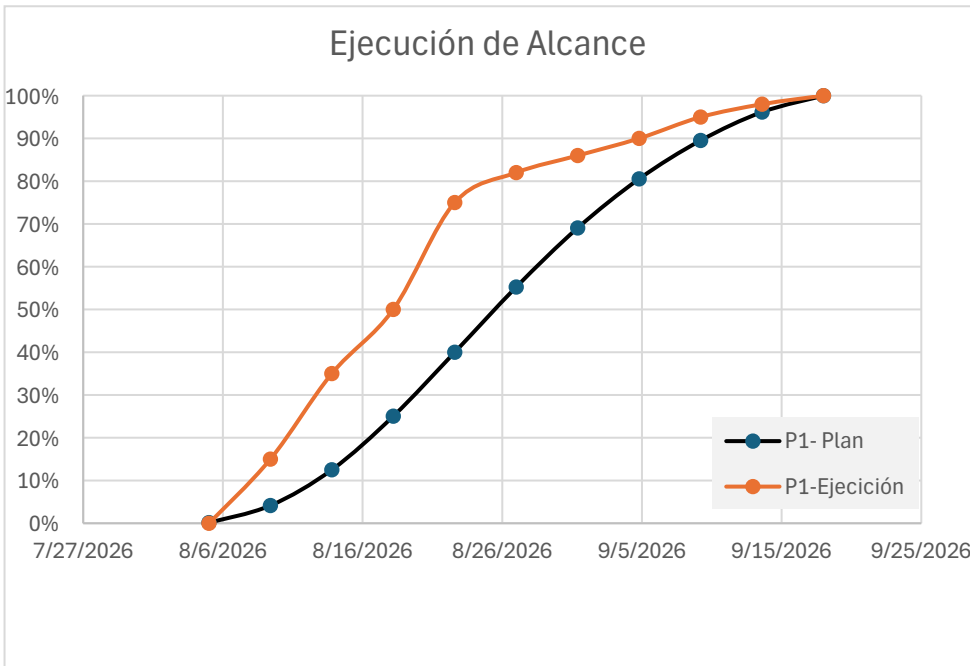

ESTADO ACTUAL	100%
---------------	------

Notas de seguimiento:

Nota 1.	08-09-26	Envío de la OC por parte del Cliente	Nota 6.	08-31-26	El equipo multidisciplinario trabaja en los ajustes y la producción documental de la ingeniería de acuerdo a la nueva condición de protección unificada.
		Firma del Acta de Inicio de los trabajos			
		Reunión con el Cliente para clarificar enfoque de solución del proyecto			
Nota 2.	08-13-26	Preparación documental de los soportes de ingeniería del proyecto	Nota 7.	09-04-26	Se emite a completitud la revisión B de la ingeniería
		Inicio de la producción gráfica, planimetría y maquetas 3D			
		Preparacín de Data Sheet de ESDV. Dos opciones, Actuadores Lineales vs Conjunto VB+Actuador			
Nota 3.	08-18-26	Consulta a proveedores locales para cotizar costos de mercado	Nota 8.	09-09-26	Se sostiene reunión con el cliente, sugiriendo realizar ajustes menores en algunos documentos e inclusión de notas de orientación constructiva al ejecutor de la obra.
		Esbozo de la Alternativa de Arquitectura de supervisión a revisión del cliente.			Ante la falta de claaridad de la aceptación del equipo Propuesto PY para integración SCADA, se solicita que la versión 0 incluya integración convencional por vía RTU independiente bajo un esquema de integración SCADA 100% AGT.
		Preparación de micro sitio web con la Rev A de la producción documental del proyecto.			Se procede a preparar la Revisión Cero de acuerdo al último planteamiento realizado de integrar supervisión y control a través de una RTU 100% AGT
Nota 4.	08-22-26	Entrega de Avances a revisión formal del cliente y su equipo de colaboradores.	Nota 9.	09-13-26	Se remite formalmente la documentación de entrega al cliente para su respectiva revisión.
		Disposición en sitio web del dossier de ingeniería, botón de descarga del proyecto y previsualizador de archivos en línea, todo con sistema embebido de autenticación de usuarios al 100% funcional.			
Nota 5.	08-27-26	En reunión conjunta con el cliente y los miembros del equipo se define la conveniencia de implementar un arreglo de protección unificada para el segundo punto de protección, aguas abajo del cruce la china.	Nota 10.	09-18-26	Se aguarda por la aceptación formal del cliente y la entrega del respectivo número de entrada de aceptación de la plataforma SAP, para facturar el servicio.

