

CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO (PDT)


Fecha:	8/5/2026
CLIENTE:	Promigas / Promioriente
Responsable:	Gerencia de Proyectos / Ing. Cristian Pedraza
E-mail:	cristian.pedraza@promigas.com

Código:	1749-PC-X-150
Orden de Compra:	4900117705
Rev:	A
Pág:	1 de 1

Ejecutor: SEDIMA CORP	Proyecto: INGENIERÍA DETALLADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTÓNOMO PARA LA LÍNEA TEMPORAL SAMORÉ: CRUCE "LA CHINA"
Lider: - Gerencia de Proyectos	Plan de trabajo: A: Emisión OC y Firma Acta de inicio. B: Planeación de la ejecución del proyecto. C: Análisis y revisión de alineamiento a los insumos y documentación técnica suministrada por el cliente (AGT) D: Desarrollo de solución por bloques disciplinares en estructura de apoyo profesional. E: Presentación al cliente de avances y resultados de enfoque y abordaje de la solución. F: Ajustes finos de la solución ppara entrega final al cliente. G: Entrega de solución documentada al cliente. H: Apoyo complementario en sostenimiento postventa.
Interesados: - Promioriente - VPO - Autoridades externas	

PLAN de TRABAJO	
Fecha de inicio:	8/5/2026
Fecha de Finalización:	9/18/2026
Tipo de Acción / Prioridad:	ESTRATEGICO - NECESARIO

Punto de Control	% Avance realizado
0	8/5/2026 0%
1	8/9/2026 15%
2	8/13/2026 35%
3	8/18/2026 50%
4	8/22/2026
5	8/27/2026
6	8/31/2026
7	9/4/2026
8	9/9/2026
9	9/13/2026
10	9/18/2026

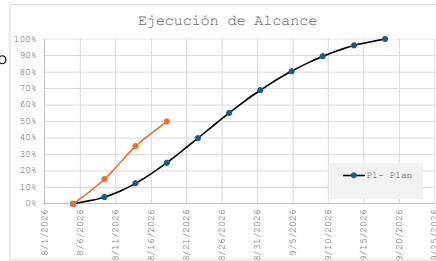

ESTADO ACTUAL	50%
----------------------	------------

Notas de seguimiento:

Nota 1.	8/9/2026	Envío de la OC por parte del Cliente Firma del Acta de Inicio de los trabajos Reunión con el Cliente para clarificar enfoque de solución del proyecto	Nota 6.	8/31/2026	
Nota 2.	8/13/2026	Preparación documental de los soportes de ingeniería del proyecto Inicio de la producción gráfica, planimetría y maquetas 3D Preparación de Data Sheet de ESDV. Dos opciones, Actuadores Lineales vs Conjunto VB+Actuador Consulta a proveedores locales para cotizar costos de mercado Esbozo de la Alternativa de Arquitectura de supervisión a revisión del cliente	Nota 7.	9/4/2026	
Nota 3.	8/18/2026	Preparación de micro sitio web con la Rev A de la producción documental del proyecto. Entrega de Avances a revisión formal del cliente y su equipo de colaboradores	Nota 8.	9/9/2026	
Nota 4.	8/22/2026		Nota 9.	9/13/2026	
Nota 5.	8/27/2026		Nota 10.	9/18/2026	

